



Proposta de implementação para a operação Lloretrans.

Investimento recomendado de € 45.000 em preço fechado, **Sprint 0 oferecida** e mensalidade faseada de € 600 a € 900/mês. A plataforma centraliza quilómetros, documentos, facturas de fornecedor, bolsa de carga, comissões e oficina em **14 semanas**.

Para: Clarice Santos · Direcção Lloretrans · Grupo Patrícia Pilar

De: Bilal Machraa · AiTiPro

Âmbito: Plataforma operacional Lloretrans · 6 módulos

Recomendação: Opção C · Solução Completa

PRINCÍPIO OPERACIONAL

A IA prepara. A pessoa decide. O sistema regista.

A AiTiPro é uma empresa portuguesa especializada em soluções de Inteligência Artificial aplicadas à operação. Todos os passos irreversíveis permanecem sujeitos a validação humana e registo de auditoria.

Decisão por evidência operacional, retorno e faseamento.

Esta proposta cobre a implementação de uma plataforma operacional para a Lloretrans, com seis módulos que centralizam validação de quilómetros, documentos, facturas de fornecedor, bolsa de carga, comissões e folha de obra de oficina. O módulo de combustível fica como opção futura.

A entrega completa faz-se em **14 semanas**, incluindo estabilização. A primeira semana é **Sprint 0 sem custo**, usada para validar integrações, volumes, tempos reais e custos.

INVESTIMENTO RECOMENDADO

€ 45.000

MENSALIDADE COMPLETA

€ 900/mês

BREAK-EVEN ESTIMADO

Mês 9


DIFERENÇA 36M

€ 135.936

SPRINT 0 · VALIDAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

1 semana · € 0 para a Lloretrans · risco AiTiPro.

A Sprint 0 valida acessos PHC Advanced, Frotcom e Logue Trans, confirma volumes documentais, mede custos actuais por bloco e transforma a análise de retorno em números confirmados. Se identificar bloqueio técnico crítico sem caminho viável, a Lloretrans não paga nada.

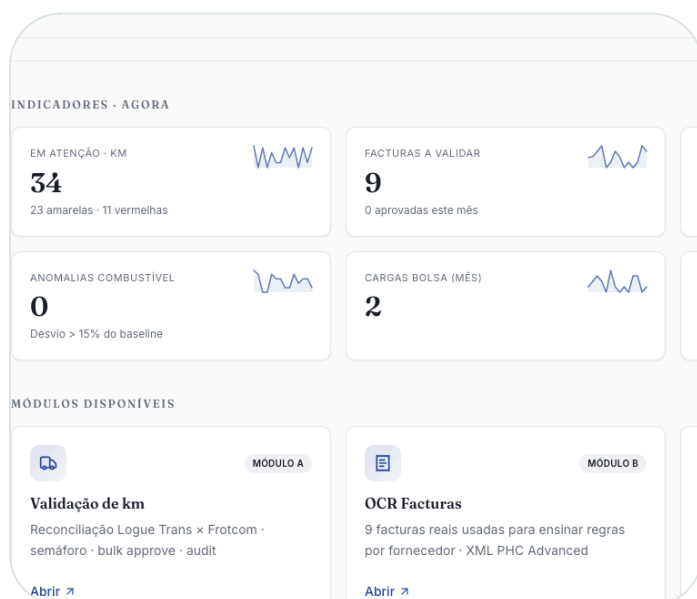

160

viagens no cenário de validação de quilómetros, com margem confirmada a 3 km.

92,4%

confiança média na classificação automática de facturas reais.

306

cargas reais convertidas de Excel para fluxo auditado.

2.161

abastecimentos reais agregados para análise de combustível.

Três âmbitos de decisão, com Sprint 0 oferecida.

OPÇÃO A

Núcleo de Validação
Sprint 0 + Bloco 1 · Módulos A + C

€ 14.000
€ 600/mês após entrada em produção do primeiro bloco.

- PRI estimado no mês 6.
- Diferença 36m: € 69.700.
- Menor exposição financeira inicial.

OPÇÃO B

Núcleo Administrativo
Sprint 0 + Blocos 1+2 · A + C + B

€ 25.500
€ 700/mês após entrada em produção do Bloco 2.

- PRI cumulativo estimado no mês 8.
- Diferença 36m: € 95.424.
- Inclui OCR de facturas.

OPÇÃO C RECOMENDADA

Solução Completa
Sprint 0 + Blocos 1+2+3 · A + C + B + E + F

€ 45.000
€ 900/mês após entrada em produção completa.

- PRI estimado no mês 9.
- ROI estimado a 36 meses: +302%.
- Diferença 36m: € 135.936.

OPÇÃO	INVESTIMENTO	MENSALIDADE	PRI	DIFERENÇA 36M
Opção A · Núcleo de Validação A + C	€ 14.000	€ 600	Mês 6*	€ 69.700*
Opção B · Núcleo Administrativo A + C + B	€ 25.500	€ 700	Mês 8*	€ 95.424*
Opção C · Solução Completa A + C + B + E + F	€ 45.000	€ 900	Mês 9*	€ 135.936*

*Estimativas com volumes, tempos e custos indirectos a confirmar na Sprint 0. Se houver bloqueio técnico crítico, não há cobrança.

Retorno estimado da Implementação Completa.

A solução completa reduz o custo futuro total estimado para € 1.559/mês e cruza o investimento perto do mês 9.

Implementação Completa · retorno acumulado

€ 45.000 + € 900/mês · custo futuro total
€ 1.559/mês.

CUSTO ACTUAL


€

6.585/mêsSOLUÇÃO
36M

€

101.124DIFERENÇA
36M

€

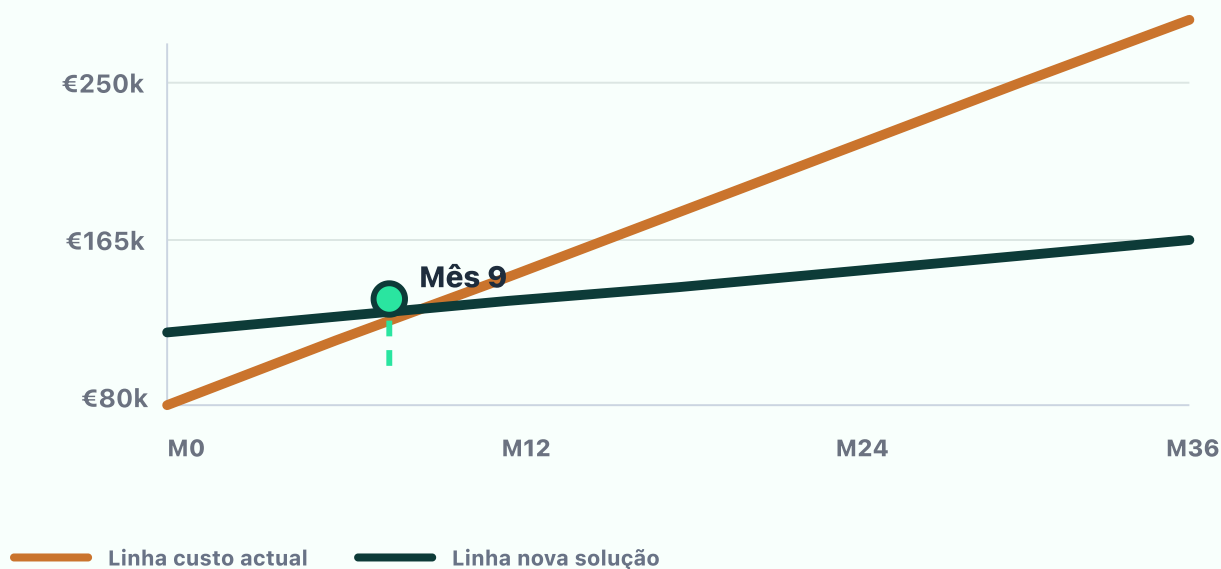135.936

Leitura financeira

O retorno ocorre quando o custo acumulado da nova solução passa a ser inferior ao custo acumulado do processo actual. A poupança acumulada aos 36 meses corresponde à diferença entre os dois custos acumulados.

RH actual, investimento e custo mensal da solução.

Custo HH de referência: € 15/h. A Sprint 0 substitui esta referência por tempos cronometrados e custos reais da Lloretrans antes de fechar a análise financeira.

ÂMBITO	CUSTO ACTUAL MENSAL	INVESTIMENTO	CUSTO FUTURO MENSAL	GANHO/MÊS	RETORNO
Bloco 1 A + C	157 h · € 2.350 RH € 900 indirectos € 3.250	€ 14.000	16 h · € 235 RH € 90 indirectos € 600 mensalidade € 925	+€ 2.325	Mês 6 ROI +498%
Bloco 2 B	24 h · € 360 RH € 900 indirectos € 1.260	€ 11.500	2 h · € 36 RH € 90 indirectos +€ 100 mensalidade € 226	+€ 1.034	Mês 11 ROI +224%
Bloco 3 E + F	38 h · € 575 RH € 1.500 indirectos € 2.075	€ 19.500	4 h · € 58 RH € 150 indirectos +€ 200 mensalidade € 408	+€ 1.667	Mês 12 ROI +208%
Total incluído A + C + B + E + F	219 h · € 3.285 RH € 3.300 indirectos € 6.585	€ 45.000	22 h · € 329 RH € 330 indirectos € 900 mensalidade € 1.559	+€ 5.026	Mês 9 ROI +302%

O que a Sprint 0 confirma

- Horas gastas por processo.
- Volume mensal de viagens, documentos, facturas, cargas e folhas de oficina.
- Retrabalho, custos indirectos e bloqueios técnicos.

Módulo D

O Módulo D permanece como opção futura e sem cobrança hoje. Se for activado, o investimento adicional é € 7.500.

Seis módulos, responsabilidades claras.

MÓDULO A · VALIDAÇÃO KM

Validação de Quilómetros

Incluído no Bloco 1. Reconciliação Logue Trans x Frotcom, semáforo verde/amarelo/vermelho, margem de 3 km, aprovação em lote e exportação CSV para PHC Advanced.

MÓDULO B · OCR FORNECEDOR

OCR Facturas de Fornecedor

Bloco 2 · € 11.500. Carregamento de PDF, extracção automática, classificação por NIF, validação humana, regra por fornecedor e ficheiro XML para PHC Advanced.

MÓDULO C · DOCUMENTOS

Digitalização Central de Documentos

Incluído no Bloco 1. Hub documental único, associação por matrícula, data e número CMR, com permissões entre empresas do grupo.

MÓDULO D · COMBUSTÍVEL

Médias de Combustível

Opção futura · € 7.500 · sem cobrança hoje. Cepsa, Repsol, Radius, bomba interna e Frotcom ficam sujeitos a validação técnica na Sprint 0.

MÓDULO E · BOLSA E COMISSÕES

Bolsa de Carga + Comissões

Incluído no Bloco 3. Aplicação com 306 cargas reais, estados operacionais, facturação fornecedor/cliente e comissões automáticas pela regra confirmada.

MÓDULO F · OFICINA

Folha de Obra Oficina

Incluído no Bloco 3. Aplicação móvel com estados, assinatura, validação administrativa e exportação para integração PHC Advanced.

Combustível permanece fora do total recomendado.

O investimento recomendado inclui os módulos A, B, C, E e F. O Módulo D entra apenas após confirmação técnica do acesso à Frotcom e validação da qualidade dos dados de abastecimento.

INVESTIMENTO RECOMENDADO

€ 45.000 de implementação, preço fechado.

ITEM	DETALHE	VALOR
Sprint 0	Validação técnica, PHC Advanced, Frotcom, Logue Trans, volumes mensais e plano final.	€ 0
Bloco 1	Módulos A + C · validação km + hub documental.	€ 14.000
Bloco 2	Módulo B · OCR facturas fornecedor e exportação PHC Advanced.	€ 11.500
Bloco 3	Módulos E + F · bolsa de carga, comissões e folha de obra oficina.	€ 19.500
Módulo D	Opção futura, sem cobrança hoje.	€ 0 hoje
Total recomendado	Sprint 0 + Blocos 1, 2 e 3.	€ 45.000

Investimento total se o Módulo D for activado no futuro: € 52.500.

MENSALIDADE E SERVIÇOS INCLUÍDOS

€ 600 a € 900/mês conforme o âmbito aprovado.

RECURSO	INCLUÍDO	ACIMA DO LIMITE
Hosting e infra	Servidores e base de dados na UE, backups e monitorização.	Incluído
Documentos OCR/IA	Até 5.000 documentos/mês.	€ 0,12/doc.
Storage	Até 50 GB acumulados.	€ 0,40/GB/mês.
Utilizadores	Até 30 utilizadores activos.	€ 8/utilizador/mês.
Empresas do grupo	Lloretrans + 2 empresas adicionais.	€ 250/mês por empresa.
Suporte técnico	Até 8h/mês.	€ 65/hora.

Condições comerciais

Solução Completa

30% à assinatura, 40% no arranque do Bloco 2 e 30% após entrada em produção do Bloco 3.


Opções A e B

Pagamento integral à assinatura ou 50/50 entre assinatura e entrada em produção.

Mensalidade

Facturada a partir da entrada em produção do primeiro bloco aprovado.

14 semanas até operação completa.

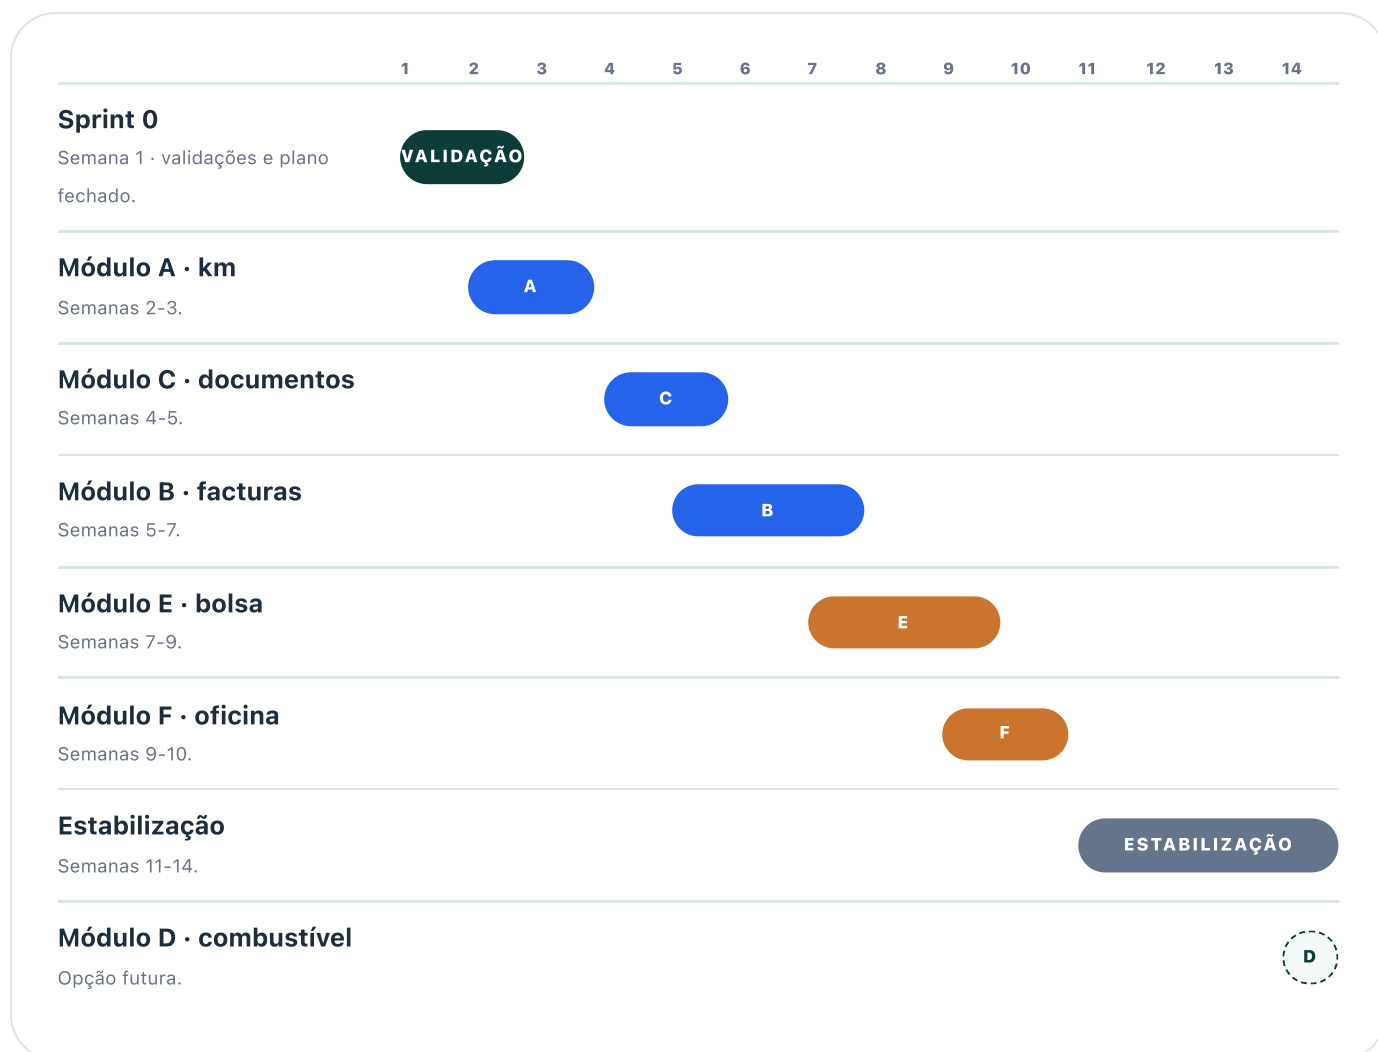

O que está confirmado

- Classificação treinada com facturas reais.
- Margem de quilómetros confirmada a 3 km.
- Regra de comissão confirmada: 20% lucro + €2,50 nacional / €5 internacional.
- Existência de responsável PHC Advanced interno no grupo.

O que precisa de validação

- Acesso à API Frotcom de leitura.
- Formato XML final com responsável PHC Advanced.
- Volumes reais por mês.
- Custos actuais de RH, retrabalho e custos indirectos por bloco.

Aprovação formal da proposta.

A proposta é válida por 30 dias. Valores sem IVA.

A Lloretrans aprova:

- ☐ **Opção A · Núcleo de Validação · € 14.000 + € 600/mês**
Sprint 0 + Bloco 1 · Módulos A + C
- ☐ **Opção B · Núcleo Administrativo · € 25.500 + € 700/mês**
Sprint 0 + Blocos 1+2 · Módulos A + C + B
- ☐ **Opção C · Solução Completa · € 45.000 + € 900/mês**
Sprint 0 + Blocos 1+2+3 · Módulos A + C + B + E + F

Pagamento da Solução Completa: 30% à assinatura, 40% no arranque do Bloco 2 e 30% após entrada em produção do Bloco 3. Opções A e B: pagamento integral à assinatura ou 50/50 entre assinatura e entrada em produção, à escolha da Lloretrans.

PELA LLORETRANS

Nome / Cargo

Data / Assinatura

Carimbo da empresa

PELA AITIPRO

Bilal Machraa · Fundador

Data / Assinatura

A aceitação formaliza-se por devolução deste documento assinado e carimbado para bilal.machraa@aitipro.com. A Sprint 0 sem custo é agendada nos 5 dias úteis seguintes à recepção.

AITIPRO

Bilal Machraa

Fundador · AiTiPro

bilal.machraa@aitipro.com · aitipro.com

Destinatária: Lloretrans, Unipessoal Lda. · NIPC 509750460 · Grupo Patrícia Pilar.
